

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ปัญหา และอุปสรรค


9 มกราคม 2562

นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2



โครงการฯ ปิงปประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนบ้านไผ่ - ไผ่ศาล ที่กม.1+275 (LT.)
- 2 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนไผ่ศาล - บริบือ ที่กม.กม.22+018 (LT.), กม.28+915(LT.), กม.31+915(LT.), และ กม.34+199 (LT.)
- 3 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนหนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่กม.75+318(LT.), และกม.86+300 (LT.)

โครงการฯ ปิ๊งบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 1)

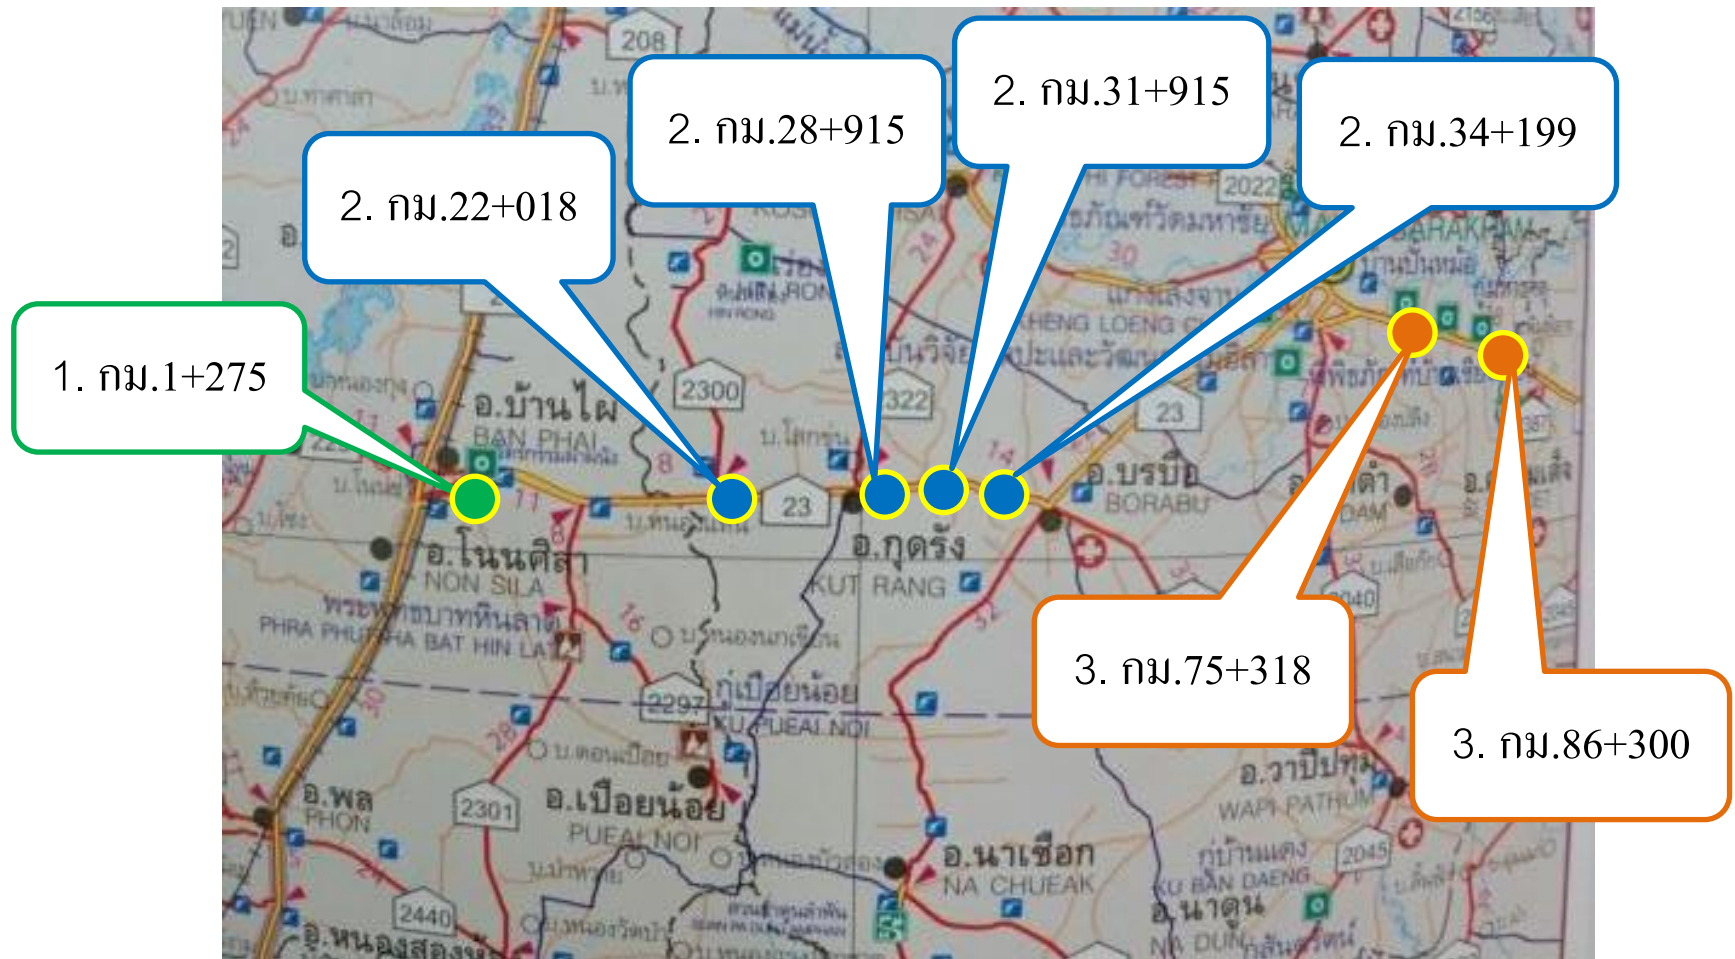

รูปแบบการก่อสร้าง

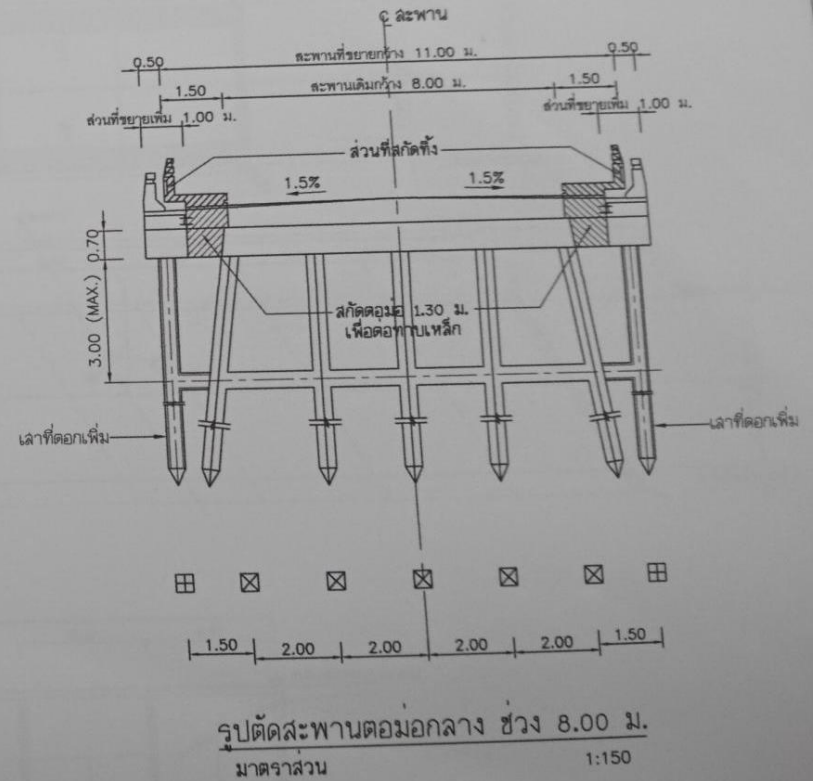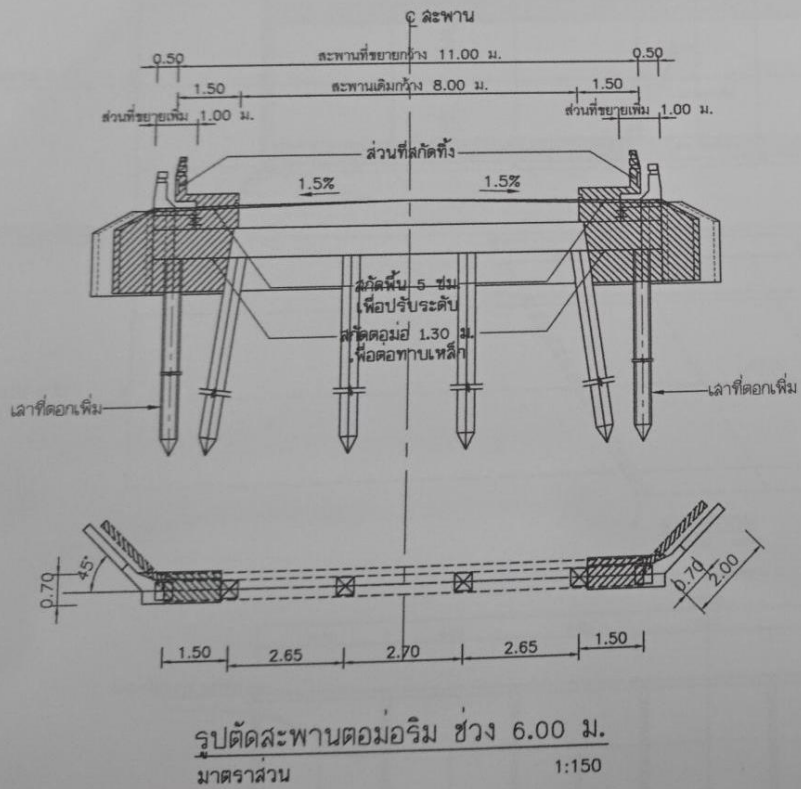






โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 4 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่กม.25+801, กม.27+992 และ กม.35+099
- 5 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394
- 6 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799

โครงการฯ ปิ๊งงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 2)

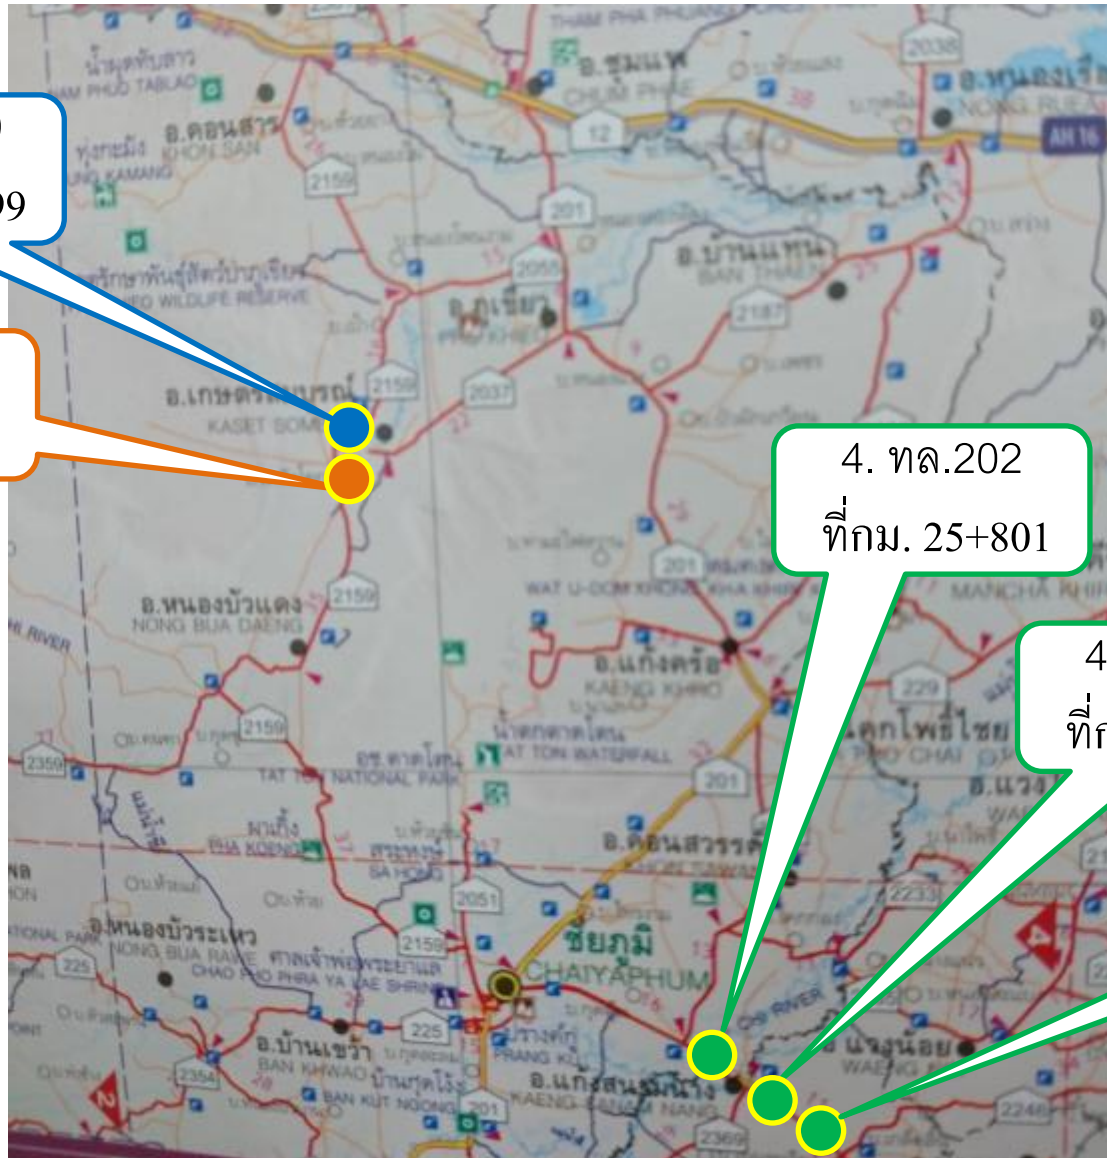

6.ทล.2159
ที่กม. 77+799



5.ทล.2159
ที่กม. 76+394

4. ทล.202
ที่กม. 25+801

4. ทล.202
ที่กม. 27+992

4. ทล.202
ที่กม. 35+099

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่ กม.25+801, กม.27+992 และ กม.35+099

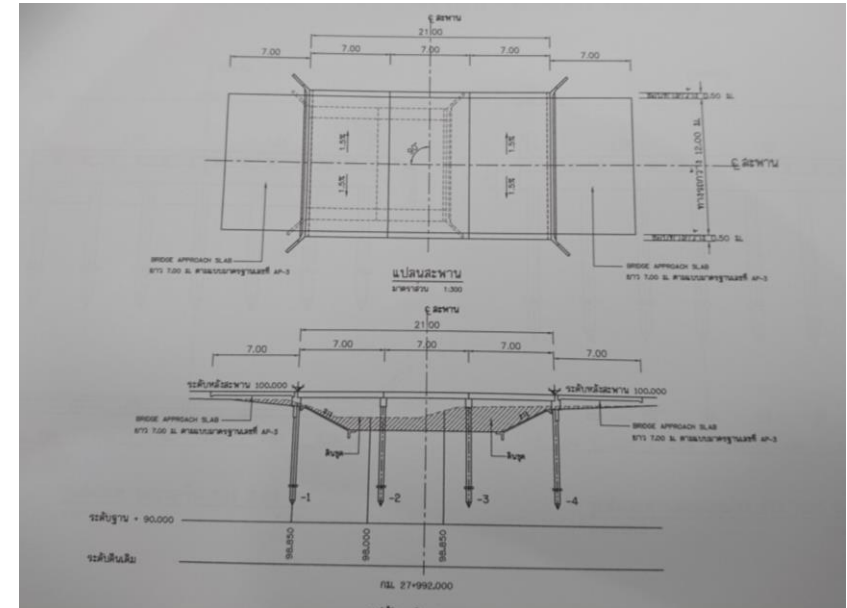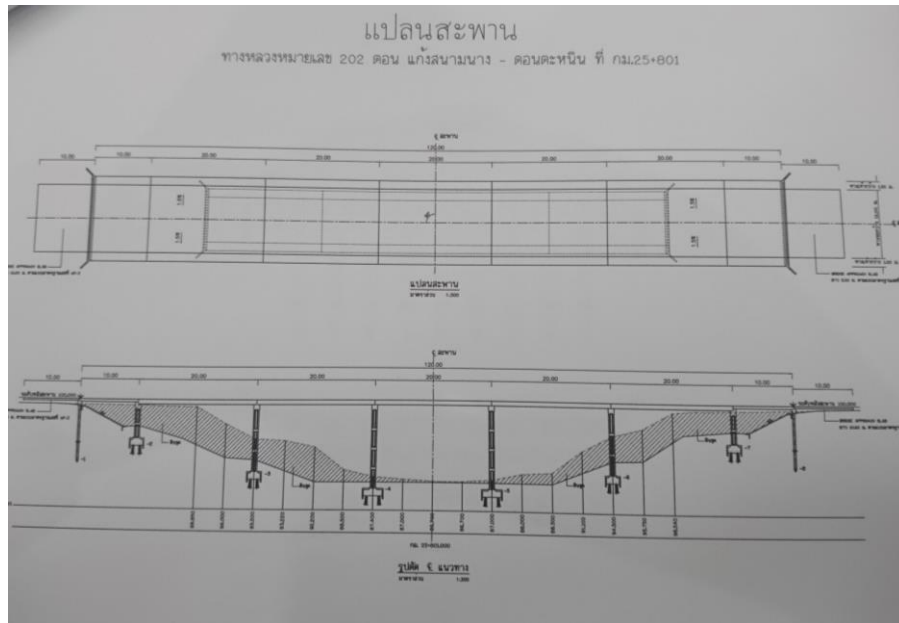

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - คอนตะหินิน ที่กม.25+801

ความก้าวหน้าของงาน : ปรับพื้นที่ เตรียมหล่อกำแพง



งานแล้วเสร็จ : กันยายน

ปัญหา อุปสรรค : ระดับน้ำยังสูง 2-3 ม.,

เป็นฤดูตัดอ้อย รื้อสะพานเดิมได้กลางเดือนมีนาคม



ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394

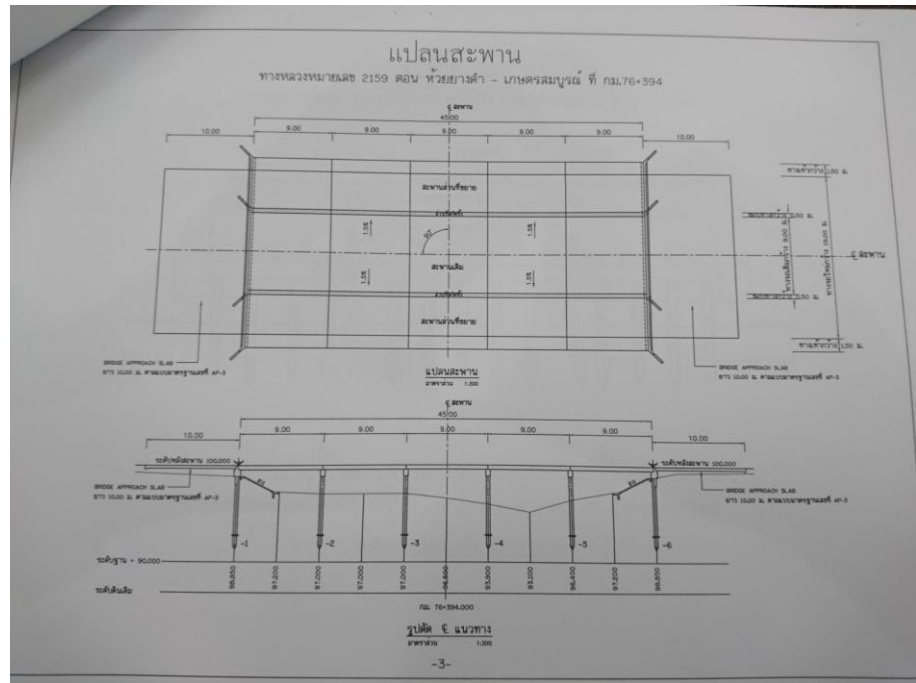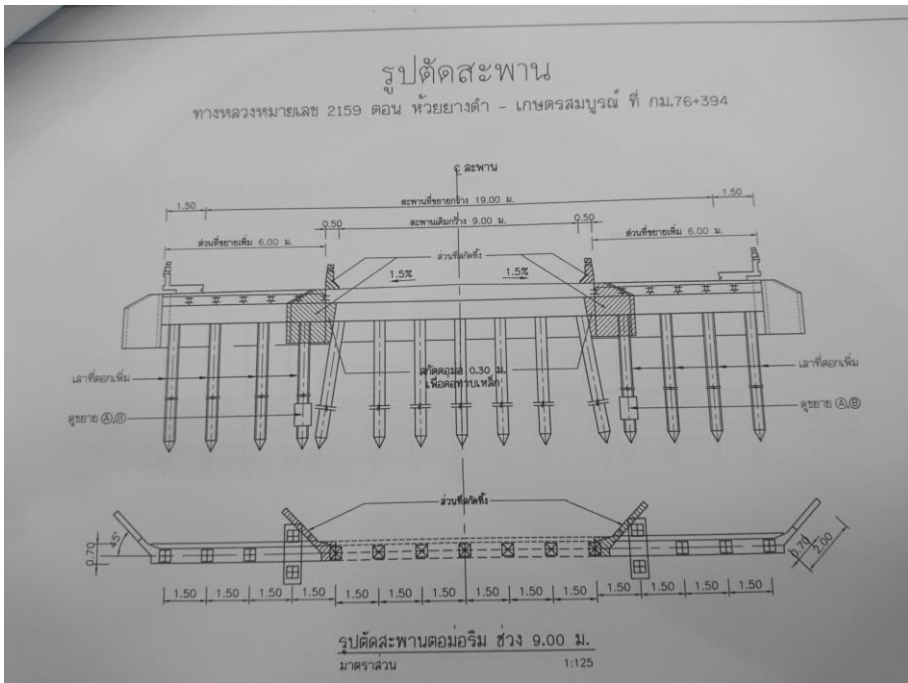

ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394



ความก้าวหน้าของงาน : ขยายทีมงานเข้าพื้นที่ ก่อสร้างที่พักคนงาน

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนกันยายน 2562

ปัญหา อุปสรรค : ระดับน้ำยังสูงประมาณ 2 ม.



ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799

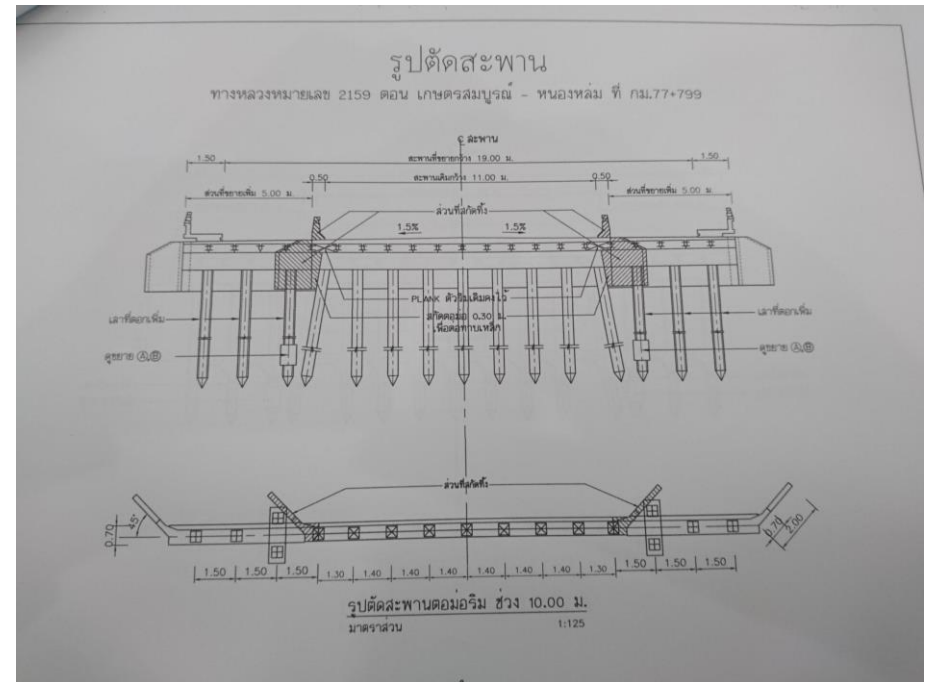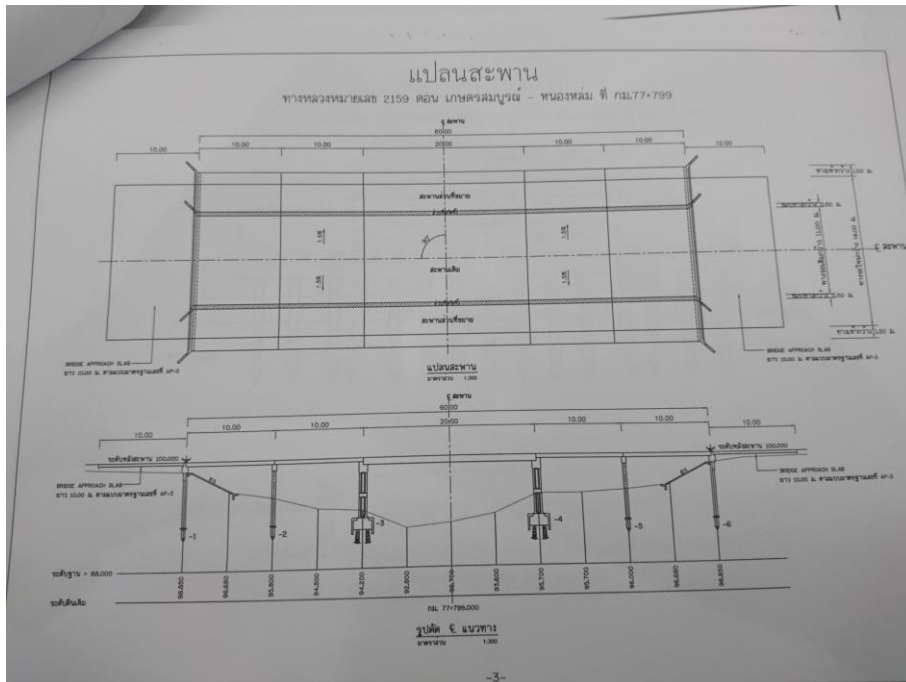

ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799

ความก้าวหน้าของงาน : ปรับพื้นที่ ประกอบปั้นจั่น

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนพฤษภาคม

ปัญหา อุปสรรค :- มีแนวท่อประปาชุมชน กีดขวางพื้นที่ก่อสร้าง
- มีสายไฟฟ้าแรงต่ำอยู่ในพื้นที่งาน



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ
