

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ปัญหา และอุปสรรค

4 กรกฎาคม 2562

นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนบ้านไผ่ - พุศาล ที่กม.1+275 (LT.)
- 2 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนพุศาล - บรปือ ที่กม.กม.22+018 (LT.), กม.28+915(LT.), กม.31+915(LT.), และ กม.34+199 (LT.)
- 3 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนหนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่กม.75+318(LT.), และกม.86+300 (LT.)



โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 4 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394
- 5 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799
- 6 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - ดอนตะหนักิน ที่กม.25+801, กม.27+992 และ กม.35+099

โครงการฯ ปิงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 2)



ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394

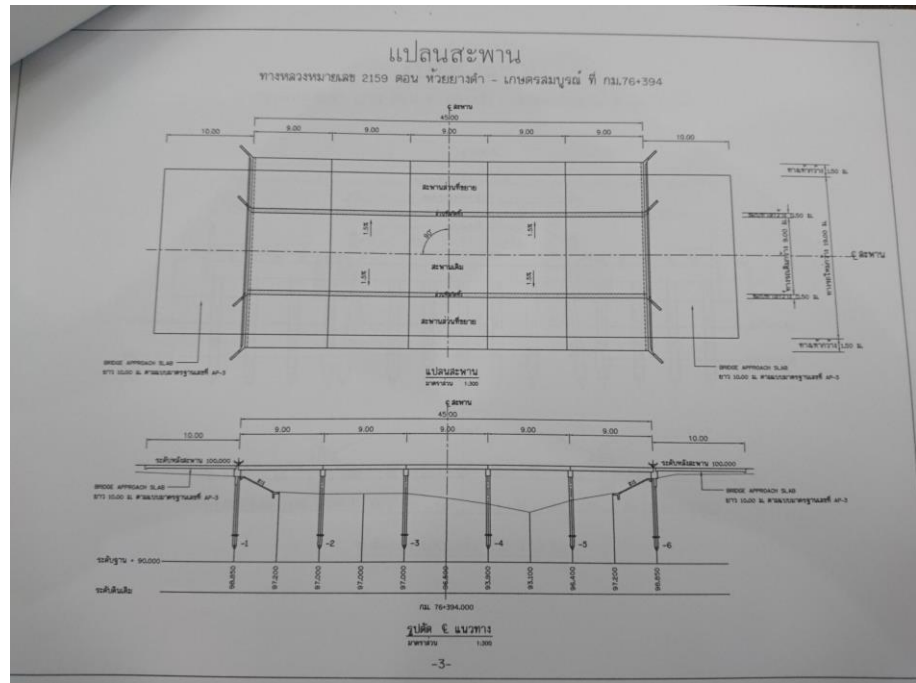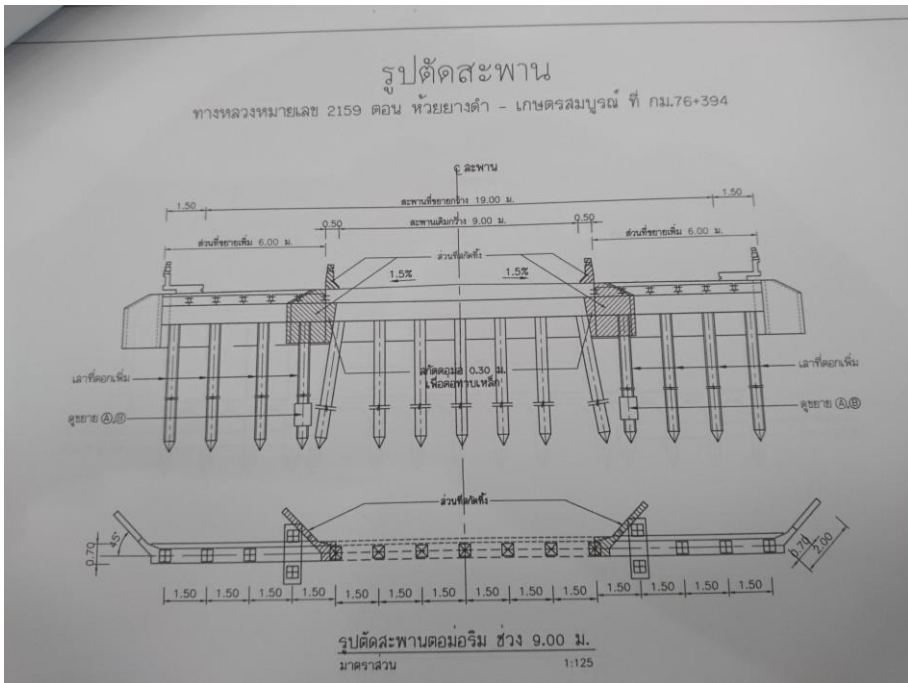


ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394

ความก้าวหน้าของงาน : เทคอนกรีตทางเท้า และ งาน Slope Protection

งานแล้วเสร็จ : เดือน กรกฎาคม 2562

ปัญหา อุปสรรค : มีฝนตกมากขึ้น



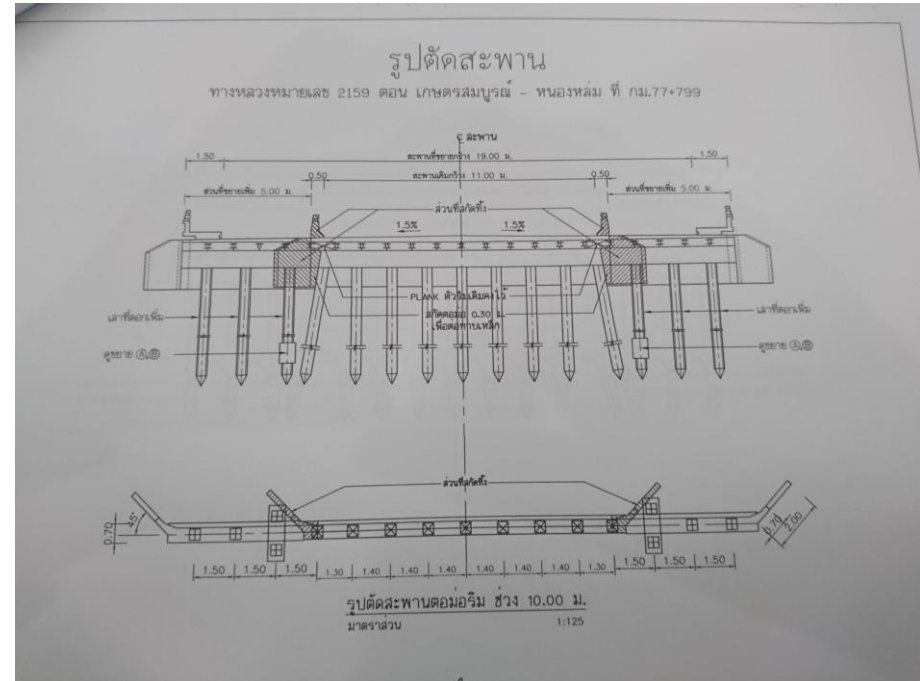

ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799


ความก้าวหน้าของงาน : เตรียมพื้นที่งาน Approach Slab, Slope Protection และ ทางเท้า

งานแล้วเสร็จ : เดือนกรกฎาคม 2562


ปัญหา อุปสรรค : มีฝนตกมากขึ้น



ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - ดอนตะหนิน

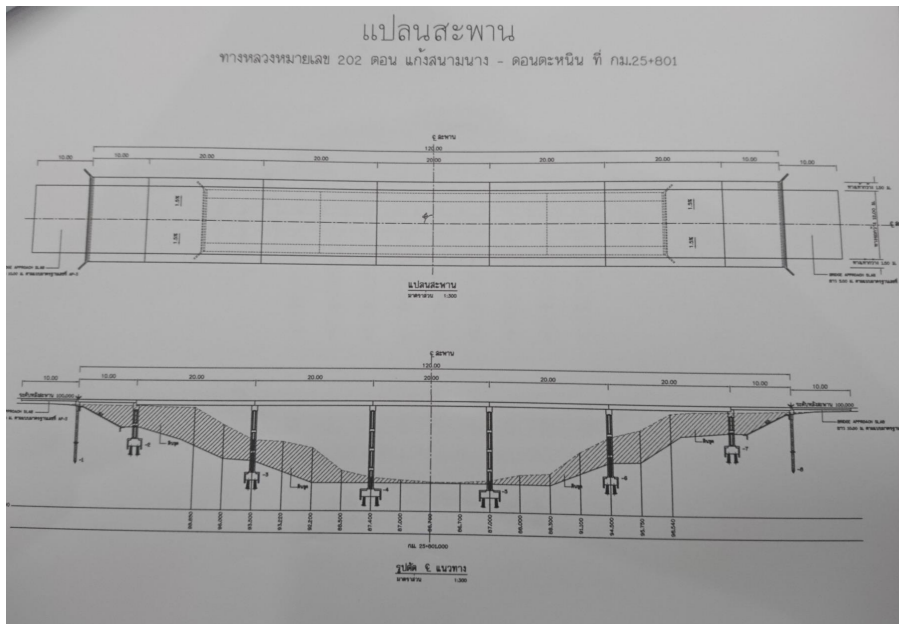



กม.25+801

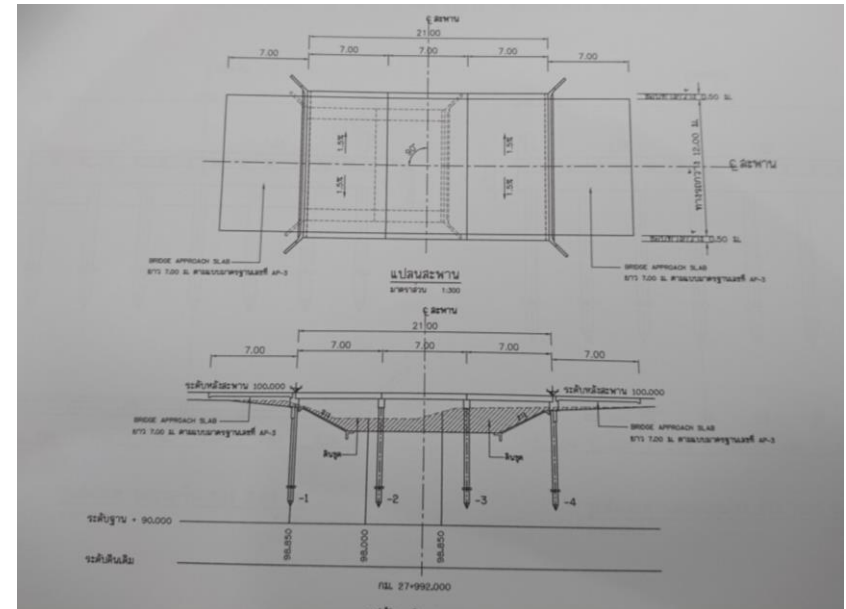

กม.27+992 และ กม.35+099

แปลนสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก่งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่ กม.25+801

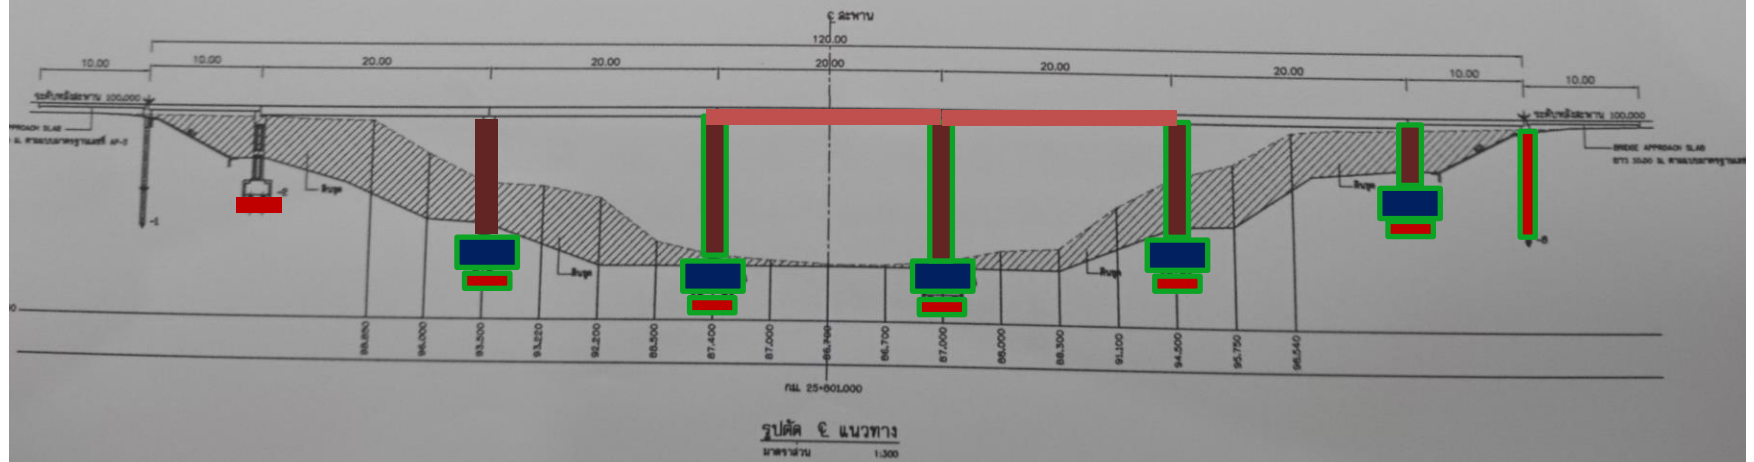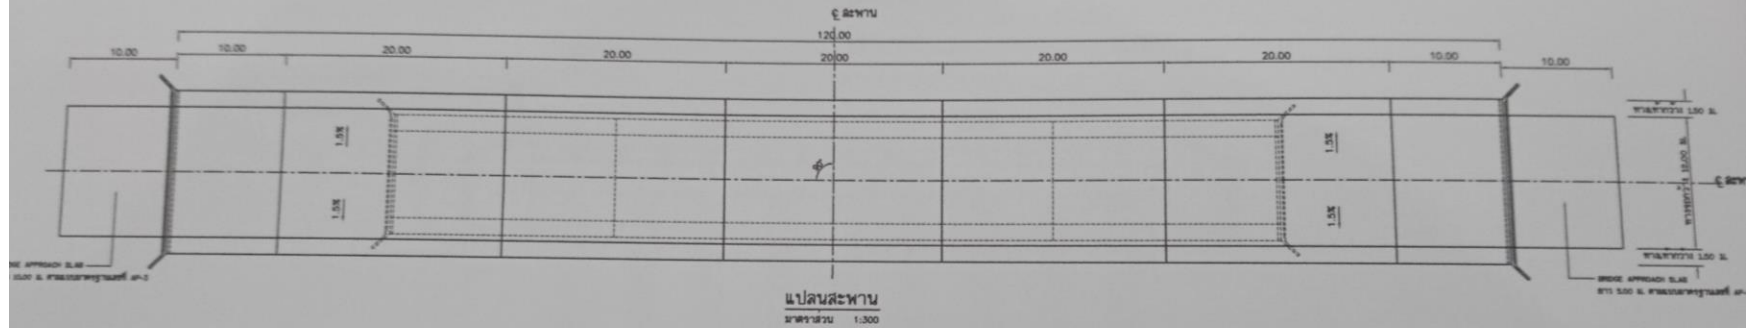

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - คอนตะหินิน ที่กม.25+801

ความก้าวหน้าของงาน : ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างฐานราก, เสากำแพง และติดตั้ง Box Girder

งานแล้วเสร็จ : กันยายน

ปัญหา อุปสรรค : มีฝนตกมากขึ้น




ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - คอนตะหินิน ที่กม.35+099

ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างทางเบียง

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนกันยายน

ปัญหา อุปสรรค : รอคู้ทำงานจากโครงการฯ เกษตรสมบูรณ์

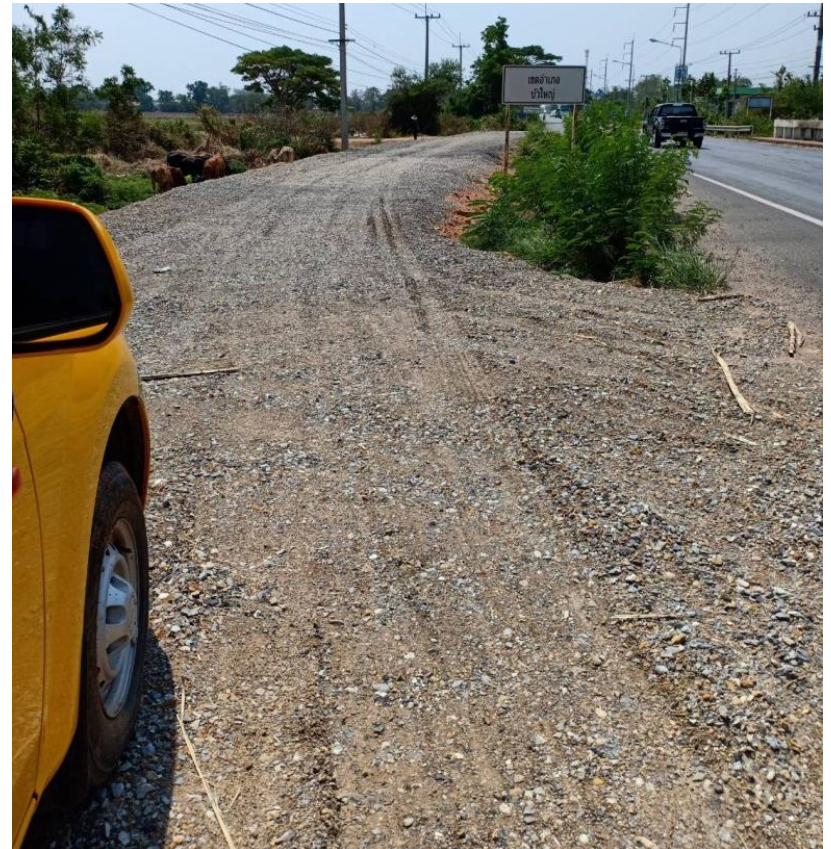

จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ
