





โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 1
ตอน รังสิต – สระบุรี ที่ กม. 99+748 (ขาออก) จ.สระบุรี

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) สำนักก่อสร้างสะพาน

ผลงานปัจจุบัน งานจ้างเหมาก่อสร้างงานถนน

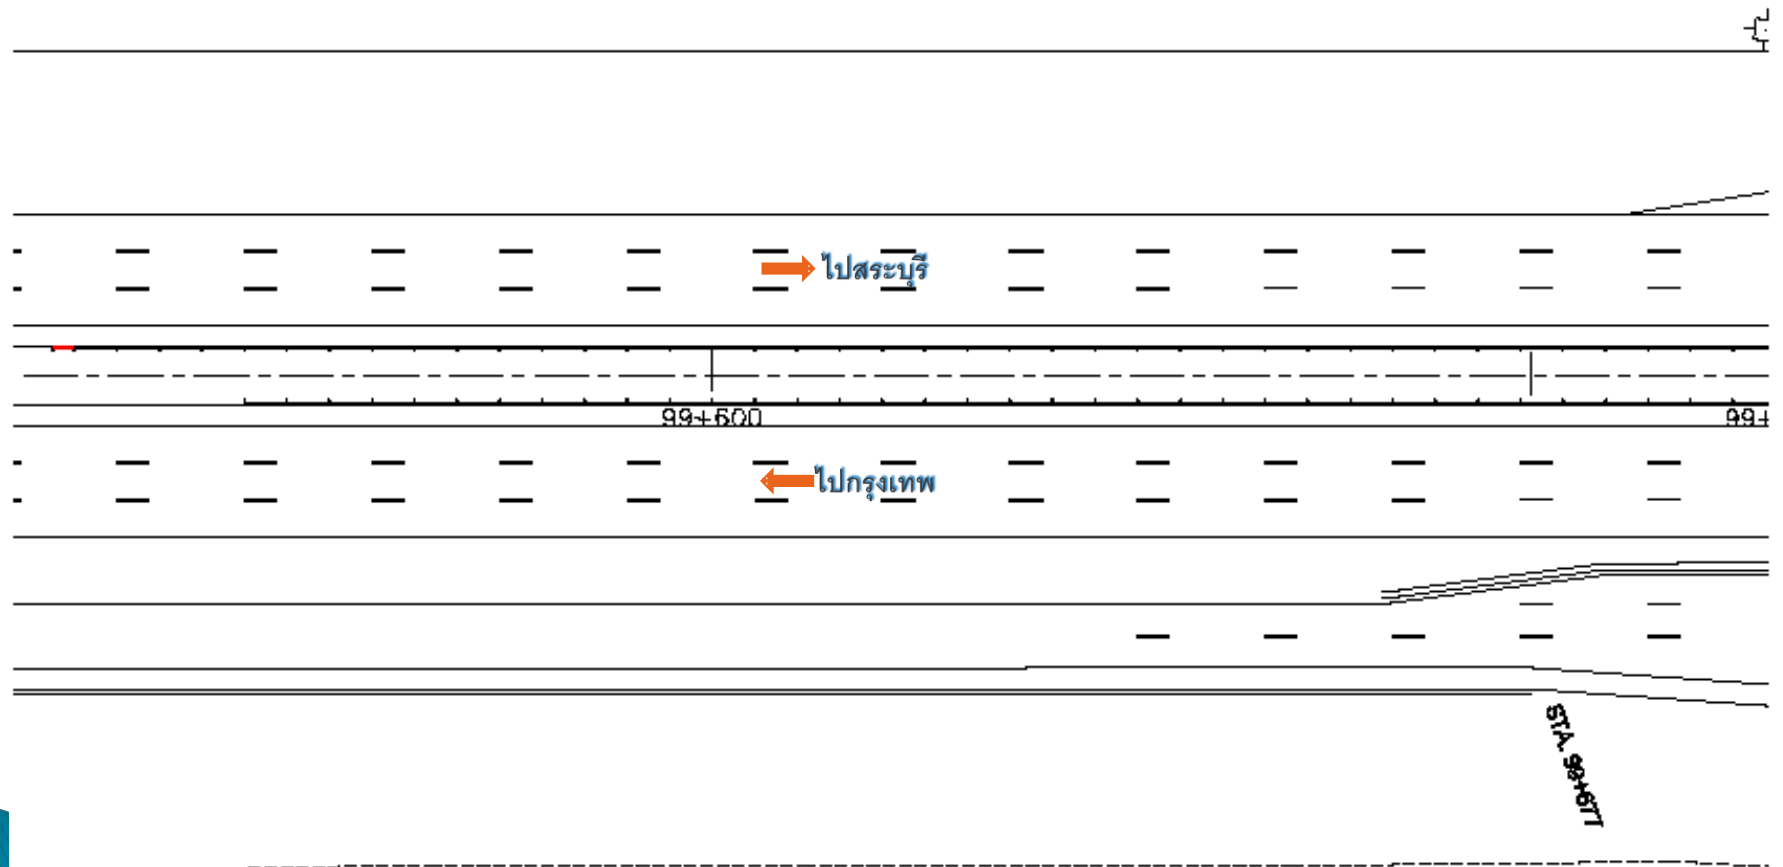


ผลงานปัจจุบัน งานจ้างเหมาก่อสร้างงานถนน

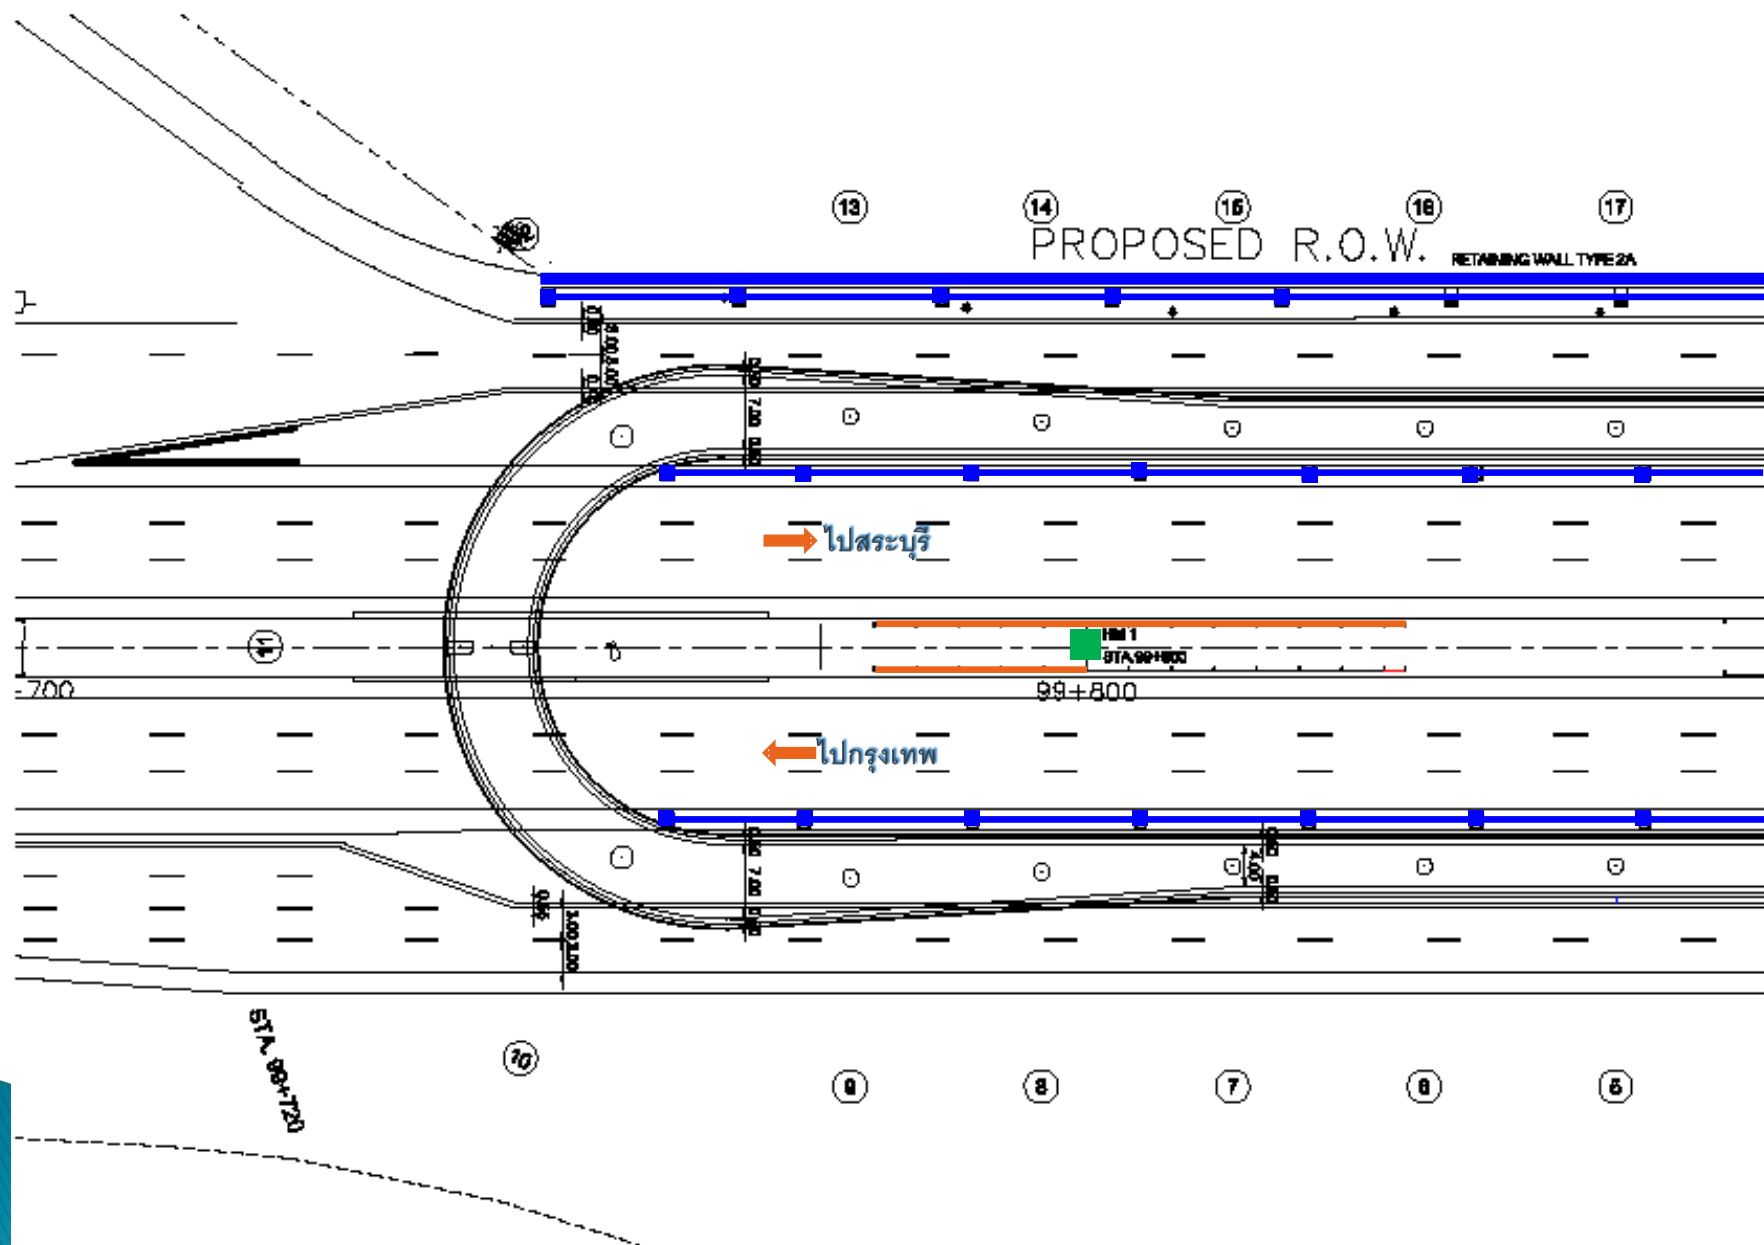


ผลงานปัจจุบัน งานจ้างเหมาก่อสร้างงานถนน

(21)

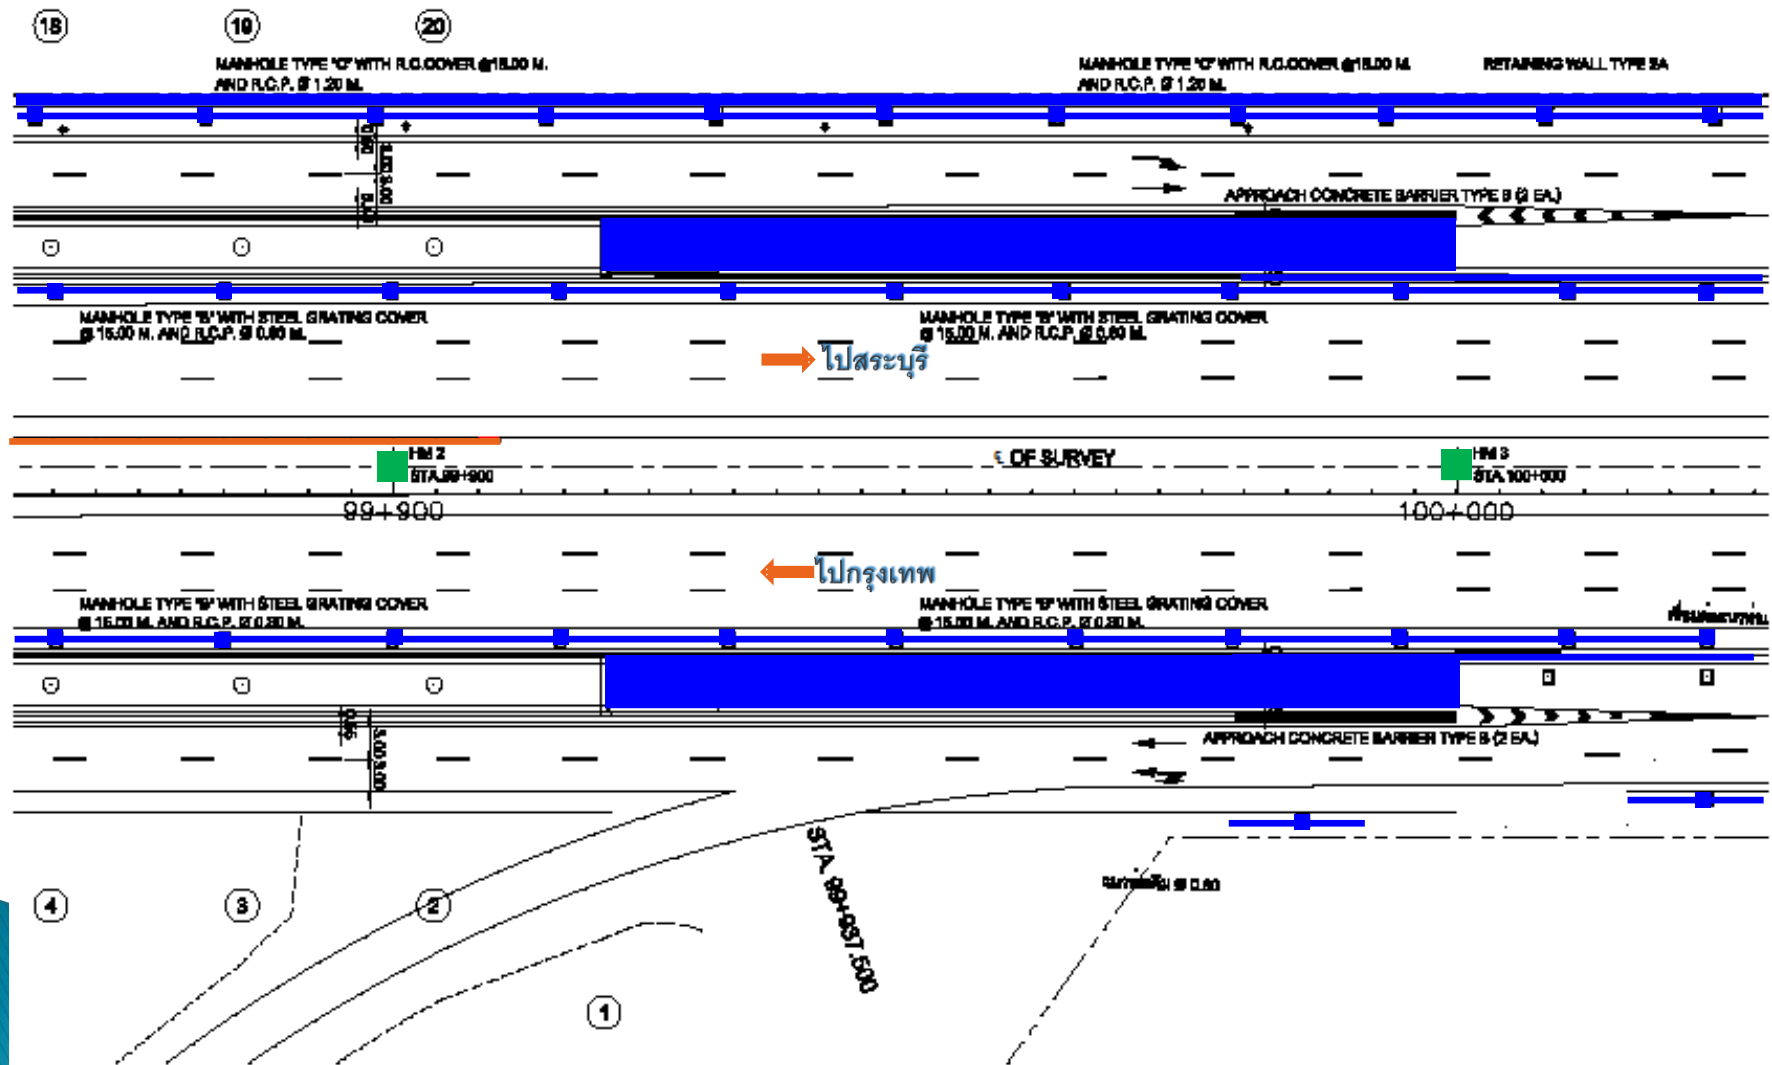


ผลงานปัจจุบัน งานจ้างเหมาก่อสร้างงานถนน


ทางหลวงหมายเลข 1

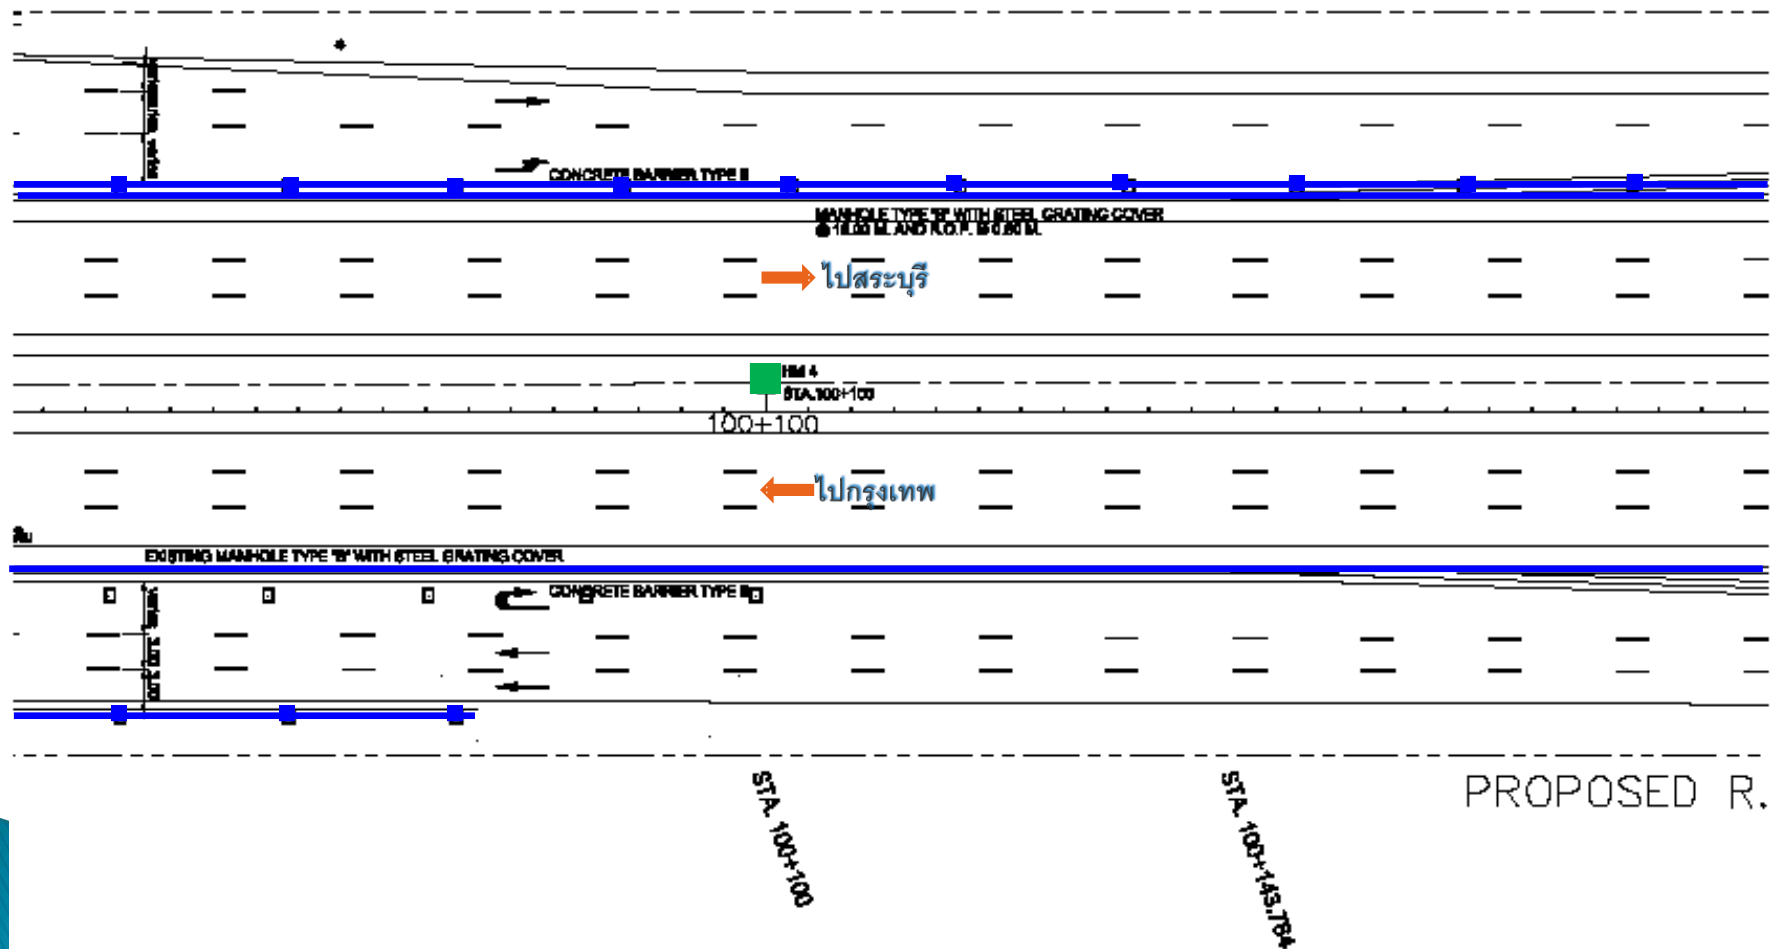

ผลงานปัจจุบัน งานจ้างเหมาก่อสร้างงานถนน

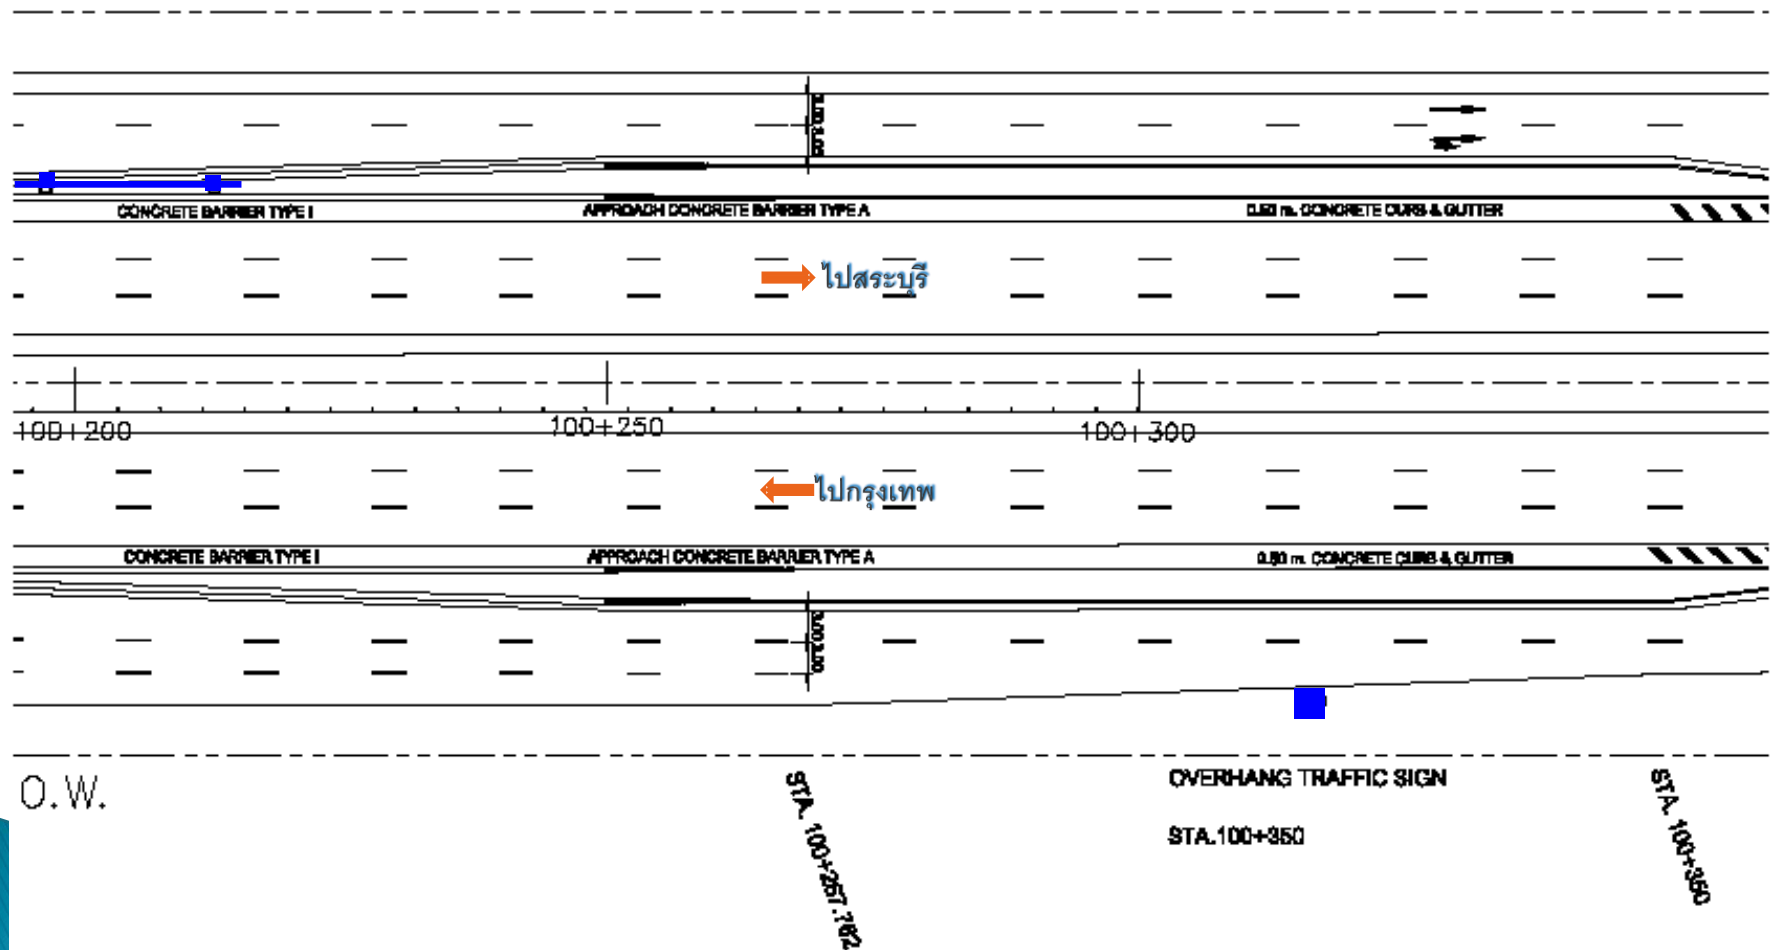

ผลงานปัจจุบัน งานจ้างเหมาก่อสร้างงานถนน

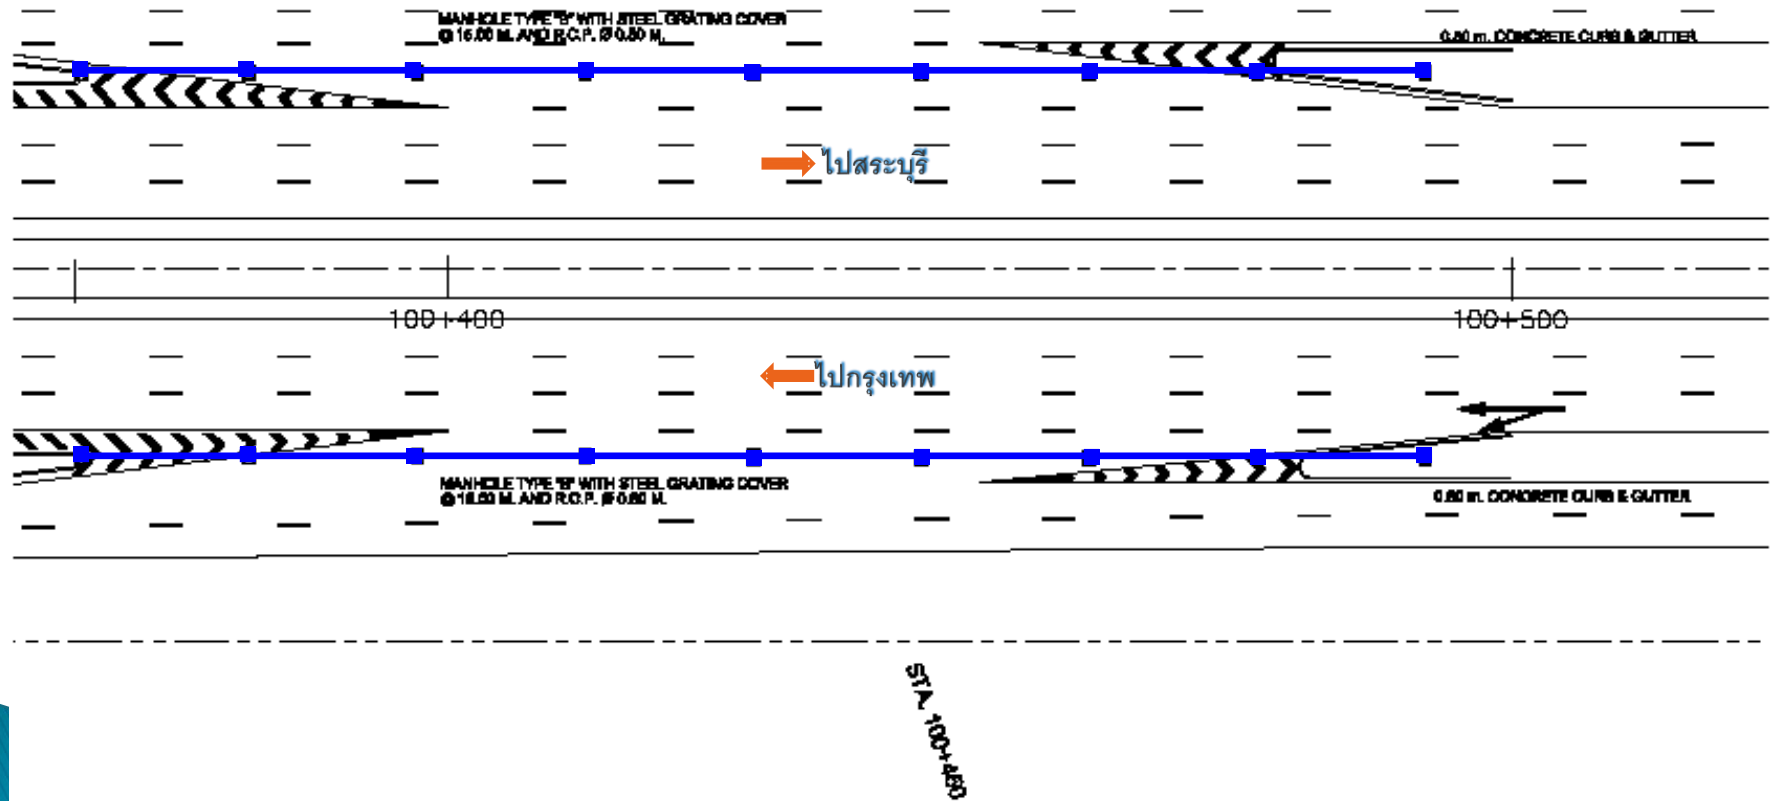

งานส่วนที่เหลือ งานจ้างเหมาก่อสร้างงานถนน

- 1.R.C. RECTANGULAR PIPE FORM CURB INLET AND MEDIAN
- 2.SIDE DITCH LINING TYPE I (CONCRETE PAVED DITCH 5 CM. THICK)
- 3.BARRIER CURB & GUTTER 0.50 M.
- 4.CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM.
- 5.THERMOPLASTIC PAINT
- 6.ROAD STUID UNI – DIRECTION
- 7.CURB MARKINGS
- 8.REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT
- 9.W - Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness Class 1 Type 1

ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน



ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน



ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน



ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน



ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน



ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน



ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน



เปอร์เซ็นต์ผลงาน

งบประมาณปี 2560

ผลงานถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2561

ผลงานที่ทำได้ รวม 83.70 %

แผนงาน รวม 100 %

งบประมาณปี 2561

ผลงานถึงสิ้นเดือน กันยายน 2561

ผลงานที่ทำได้ รวม 100.00 %

แผนงาน รวม 100.00 %

โครงการ ขยายความกว้างสะพาน คสล.
ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง
ที่ กม. 21+577 , 22+275

โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.
ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน – ห้วยปลับปลา
ที่ กม. 101+746.50 , 103+229
จ.ร้อยเอ็ด

ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน



ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน





จบการนำเสนอ ขอขอบคุณครับ
